

115493 - CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO Y SALON POLIDEPORTIVO DE ALDEA LO DE DIEGUEZ, M

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 115493
Nombre: CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO Y SALON POLIDEPORTIVO DE ALDEA LO DE DIEGUEZ, MUNICIPIO DE FRAIJANES, DEPTO. GUATEMALA.
Institución: CONSEJOS DE DESARROLLO
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE FRAIJANES
Modalidad de planificación : Plan de desarrollo o agenda municipal
Modalidad específica: Plan de desarrollo o agenda municipal
Función anterior: **Finalidad-Función-Division**
 CULTURA Y DEPORTES 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
Sub-función anterior: 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
 CULTURA Y DEPORTES 1-SERVICIOS DEPORTIVOS
Ubicación:

Departamento	Municipio
GUATEMALA	FRAIJANES

Número de Operación de Guatecompras (NOG's): - 2813246

Responsable del proyecto:

Nombre: Marco Tulio Meda Mendoza.
 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
 Teléfono: 6644-3750
 Email: mtmeda@yahoo.com

Descripción:

CONSTRUCCIÓN DE UN SALON POLIDEPORTIVO, Y PARQUE RECREATIVO EN ALDEA LO DE DIEGUEZ, DE ESTE MUNICIPIO DE FRAIJANES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2014	1,950,000.00	1,950,000.00	100.00%	100.00%
2013	5,000,000.00	3,050,000.00	61.00%	61.00%
		5,000,000.00		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 15/04/2014

Fecha de finalización 15/10/2014

Descripción de la fase a financiar:


CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO Y SALON POLIDEPORTIVO DE ALDEA LO DE DIEGUEZ, MUNICIPIO DE FRAIJANES, DEPTO. GUATEMALA.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: **100.00%** al: 29/12/15

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2014	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 29-DEC-15
TOTAL :	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
Recursos internos :	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
Gobierno central :	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

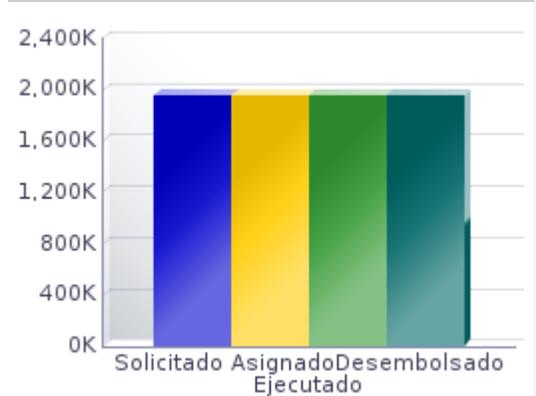

Seguimiento Físico

Avance fisico: **100.00%** al: 01/12/14

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Trabajos preliminares	m ²	880	880
Area de deportes y recreación	m ²	850	850
Circulación de areas	m ²	850	850
Modulo de graderios	m ²	200	200
Pavimentación	m ²	270	270
Instalaciones	Unidad Monetaria	100	100
Limpieza y detalles finales	m ²	100	100

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:
