

**0081026 - RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA**

SNIP - SEGEPLAN

**Boleta de Ejecución del Proyecto**

**Proyecto:** 81026  
**Nombre:** RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA  
**Institución:** MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
**Unidad ejecutora:** DIRECCION GENERAL DE CAMINOS  
**Modalidad de planificación :** Programas de reconstrucción  
**Modalidad especifica:** Tormenta Tropical Agatha  
**Función anterior:** **Finalidad-Función-Division**  
TRANSPORTE 5- ASUNTOS ECONOMICOS  
**Sub-función anterior:** 5-TRANSPORTE  
TRANSPORTE 1-TRANSPORTE POR CARRETERA  
**Ubicación:**

Departamento	Municipio
GUATEMALA	CHINAUTLA

**Número de Operación de Guatecompras (NOG's):** - 1465449 - 1486683

**Responsable del proyecto:**

Nombre: Lic. Delfino Mendoza  
Cargo: Coordinador de Planificación y Estudios  
Teléfono:  
Email: dfmendoz@caminos.gob.gt

**Descripción:**

Reconstrucción Puente Aldea Santa Cruz, sobre el Río Chinautla

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS**

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2016	.00	.00	.00%	.00%
2015	3,350,000.00	1,615,440.71	48.22%	81.84%
2014	2,709,136.00	2,573,928.86	95.01%	83.09%
2013	1,201,853.00	1,201,853.00	100.00%	56.19%
2012	6,300,000.00	3,098,499.07	49.18%	.00%
2011	5,210,000.00	2,700,598.60	51.83%	31.69%
		11,190,320.24		

**0081026 - RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA**

SNIP - SEGEPLAN

**Boleta de Ejecución del Proyecto**

**Fase: Ejecución**

**Fecha de inicio de la fase: 05/01/2015**

**Fecha de finalización 28/02/2015**

**Descripción de la fase a financiar:**


Ejecución

**Seguimiento Financiero**

**Avance Financiero: 48.22% al: 30/12/15**

**Información de recursos financieros:**

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2015	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 30-DEC-15
<b>TOTAL :</b>	5,250,000	3,350,000		1,574,690
<b>Recursos internos :</b>	5,250,000			
Gobierno central :	5,250,000			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
<b>Otras fuentes :</b>		3,350,000		1,574,690

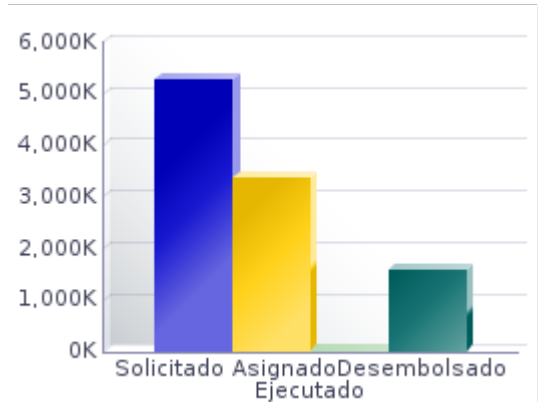

**Seguimiento Físico**

**Avance físico: 81.84% al: 25/03/15**

**Información de rubros:**

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Renglones varios	Kilogramo	5,000	3,991
Supervision	Documento	2	2

**Seguimiento Administrativo**

al:

**Problema(s):**

**Acción(es):**

**Responsable:**

**Seguimiento Cualitativo**

al:

**Problema(s):**

**Acción(es):**

**Información complementaria:**
