

**0170326 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUCOJOM, CHICHICASTENANGO, QUICHE**

SNIP - SEGEPLAN

**Boleta de Ejecución del Proyecto**

**Proyecto:** 170326  
**Nombre:** MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUCOJOM, CHICHICASTENANGO, QUICHE  
**Institución:** CONSEJOS DE DESARROLLO  
**Unidad ejecutora:** MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO  
**Modalidad de planificación :** Plan de desarrollo o agenda municipal  
**Modalidad especifica:** Plan de desarrollo o agenda municipal  
**Función anterior:** **Finalidad-Función-Division**  
TRANSPORTE 5- ASUNTOS ECONOMICOS  
**Sub-función anterior:** 5-TRANSPORTE  
TRANSPORTE 1-TRANSPORTE POR CARRETERA  
**Ubicación:**

Departamento	Municipio
QUICHE	CHICHICASTENANGO

**Número de Operación de Guatecompras (NOG's):** - 5276667

**Responsable del proyecto:**

Nombre: Rosendo Salvador Cuterez  
Cargo: Alcalde Municipal  
Teléfono: 48239678  
Email: munichichi@yahoo.es

**Descripción:**

EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL A TRAVES DEL ADOQUINAMIENTO DE UN TRAMO QUE CONDUCE AL CANTON CHUCOJOM CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  
TRABAJOS PRELIMINARES CON 500 M2.  
ROTULO DE IDENTIFICACION  
CORTE, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE CON 162 M3  
COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE CON 500 M2  
COLOCACION DE ADOQUIN CON 470 M2  
CONSTRUCCION DE LLAVES DE CONFINAMIENTO CON 50 ML  
CONSTRUCCION DE BORDILLOS CON 250 ML

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS**

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2017	40,000.00	40,000.00	100.00%	100.00%
2016	200,000.00	160,000.00	80.00%	80.39%
		200,000.00		

0170326 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUCOJOM, CHICHICASTENANGO, QUICHE

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/06/2016

Fecha de finalización 01/08/2016

Descripción de la fase a financiar:


EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR UN TRAMO DEL CAMINO RURAL DEL CANTON CHUCOJOM CON ADOQUINADO CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES CON 389 M2, CORTE, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE CON 389 M3, COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE CON 389 M2, COLOCACION DE ADOQUIN CON 365 M2, CONSTRUCCION LLAVES DE CONFINAMIENTO CON 47 ML, CONSTRUCCION DE BORDILLOS CON 190 ML, Y ROTULO DE IDENTIFICACIÓN.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: **80.00%** al: 30/12/16

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2016	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 30-DEC-16
<b>TOTAL :</b>	200,000	200,000	160,000	160,000
<b>Recursos internos :</b>	200,000	200,000	160,000	160,000
Gobierno central :	200,000	200,000	160,000	160,000
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
<b>Otras fuentes :</b>				

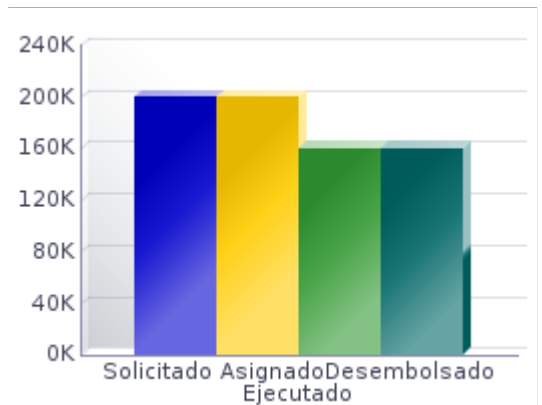

Seguimiento Físico

Avance físico: **80.39%** al: 12/12/16

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Base	m <sup>2</sup>	389	389
Construcciones complementarias	Metro	35	35
Estructuras de drenaje	Metro	7	7
Movimiento de tierras	m <sup>3</sup>	97	97
Sub bases	m <sup>2</sup>	389	389
Superficie de rodadura	m <sup>2</sup>	389	244
Trabajos preliminares	m <sup>2</sup>	389	

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:
