

0168886 - CONSTRUCCION EDIFICIO MERCADO DEPARTAMENTAL DE ARTESANÍAS, RÍO HONDO, ZACAPA

SNIP - SEGEPLAN

Resumen del Proyecto

Proyecto: 168886
Nombre: CONSTRUCCION EDIFICIO MERCADO DEPARTAMENTAL DE ARTESANÍAS, RÍO HONDO, ZACAPA
Institución: CONSEJOS DE DESARROLLO
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
Modalidad de planificación : Plan de desarrollo o agenda departamental
Modalidad especifica: Plan de desarrollo o agenda departamental
Función anterior: **Finalidad-Función-Division**
 OTRAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION 7-URBANIZACION Y SERVICIOS COMUNITARIOS
Sub-función anterior: 2-DESARROLLO COMUNITARIO
 OTRAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION 1-DESARROLLO COMUNITARIO
Ubicación:

Departamento	Municipio
ZACAPA	RIO HONDO

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Oscar Ernesto Mata
 Cargo: Alcalde Municipal
 Teléfono: 79618585
 Email: munirio1@yahoo.es

Descripción:

Se realizará la construcción del edificio para el mercado departamental de artesanías de Zacapa

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2019	.00	.00	.00%	.00%
2018	1,701,380.20	.00	.00%	.00%
2017	1,217,188.00	810,312.80	66.57%	60.00%
2016	1,000,000.00	800,000.00	80.00%	80.00%
		1,610,312.80		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/10/2017

Fecha de finalización 31/12/2019

Descripción de la fase a financiar:


CONSISTE EN EL ADOQUINADO TIPO DECORATIVO, PAVIMENTO DE RAMPA DE ACCESO, ADOQUINADO PARA TIPO DE PLAZA, TANQUE METALICO ELVADO Y ACOMETIDA ELECTRICA.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: **66.57%** al: 20/02/18

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2017	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 20-FEB-18
TOTAL :	1,017,188	1,217,188	810,313	810,313
Recursos internos :	1,017,188	1,217,188	810,313	810,313
Gobierno central :	1,017,188	1,217,188	810,313	810,313
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

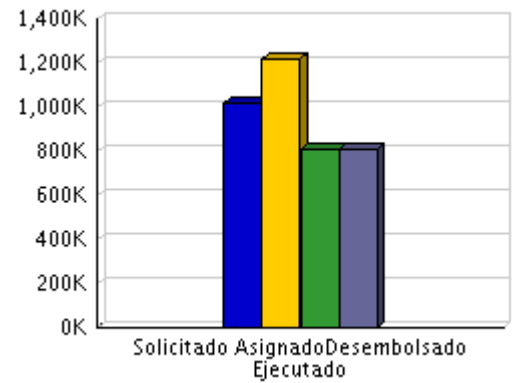

Seguimiento Físico

Avance fisico: **60.00%** al: 13/12/17

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Acabados	m ²	350	350
Trabajos preliminares	m ²	1,200	1,200
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir	m ²	600	
Obra exterior y complementaria	m ²	1,500	914

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s) :

Accion(es) :

Responsable :

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s) :

Accion(es) :

Información complementaria:
