

0168886 - CONSTRUCCION EDIFICIO MERCADO DEPARTAMENTAL DE ARTESANÍAS, RÍO HONDO, ZACAPA

SNIP - SEGEPLAN

Resumen del Proyecto

Proyecto: 168886
Nombre: CONSTRUCCION EDIFICIO MERCADO DEPARTAMENTAL DE ARTESANÍAS, RÍO HONDO, ZACAPA
Institución: CONSEJOS DE DESARROLLO
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
Modalidad de planificación : Plan de desarrollo o agenda departamental
Modalidad especifica: Plan de desarrollo o agenda departamental
Función anterior: **Finalidad-Función-Division**
 OTRAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION 7-URBANIZACION Y SERVICIOS COMUNITARIOS
Sub-función anterior: 2-DESARROLLO COMUNITARIO
 OTRAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION 1-DESARROLLO COMUNITARIO
Ubicación:

| Departamento | Municipio |
|--------------|-----------|
| ZACAPA | RIO HONDO |

Número de Operación de Guatecompr

Responsable del proyecto:

Nombre: Oscar Ernesto Mata
 Cargo: Alcalde Municipal
 Teléfono: 79618585
 Email: munirio1@yahoo.es

Descripción:

Se realizará la construcción del edificio para el mercado departamental de artesanías de Zacapa

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

| Ejercicio | Asignado | Ejecutado | % Financiero | % Físico |
|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 2018 | 1,017,188.00 | .00 | .00% | .00% |
| 2017 | 1,217,188.00 | 508,695.72 | 41.79% | 60.00% |
| 2016 | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 80.00% | 80.00% |
| | | 1,308,695.72 | | |

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/10/2017

Fecha de finalización 31/12/2019

Descripción de la fase a financiar:


CONSISTE EN EL ADOQUINADO TIPO DECORATIVO, PAVIMENTO DE RAMPA DE ACCESO, ADOQUINADO PARA TIPO DE PLAZA, TANQUE METALICO ELVADO Y ACOMETIDA ELECTRICA.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: **41.79%** al: 13/12/17

Información de recursos financieros:

| Fuente de Financiamiento | Solicitado 2017 | Asignado Actualizado | Desembolsado MINFIN | Ejecutado al: 13-DEC-17 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| TOTAL : | 1,017,188 | 1,217,188 | 810,313 | 508,696 |
| Recursos internos : | 1,017,188 | 1,217,188 | 810,313 | 508,696 |
| Gobierno central : | 1,017,188 | 1,217,188 | 810,313 | 508,696 |
| Comunidad : | | | | |
| Aporte municipal : | | | | |
| Otros aportes : | | | | |
| Otras fuentes : | | | | |

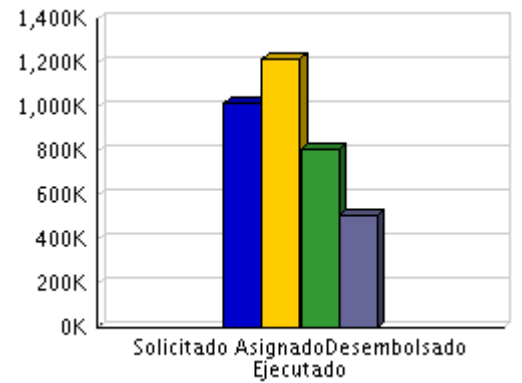

Seguimiento Físico

Avance fisico: **60.00%** al: 13/12/17

Información de rubros:

| Rubro | Unidad de medida | Reprogramado | Ejecutado |
|--|------------------|--------------|-----------|
| Acabados | m ² | 350 | 350 |
| Trabajos preliminares | m ² | 1,200 | 1,200 |
| Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir | m ² | 600 | |
| Obra exterior y complementaria | m ² | 1,500 | 914 |

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s) :

Accion(es) :

Responsable :

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s) :

Accion(es) :

Información complementaria:
