

1188909 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MA

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 188909
Nombre: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS
Institución: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
Unidad ejecutora: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos
Modalidad específica: Ejercicio de identificación de proyectos
Función anterior: **Finalidad-Función-Division**
 AGUA Y SANEAMIENTO 7-URBANIZACION Y SERVICIOS COMUNITARIOS
Sub-función anterior: 3-ABASTECIMIENTO DE AGUA
 AGUA Y SANEAMIENTO 1-ABASTECIMIENTO DE AGUA
Ubicación:

Departamento	Municipio
SAN MARCOS	ESQUIPULAS PALO GORDO

Número de Operación de Guatecompras (NOG's): - 6608299

Responsable del proyecto:

Nombre: Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
 Cargo: Unidad Ejecutora del Programa
 Teléfono: 2475 4598
 Email:

Descripción:

Mejoramiento del sistema de agua potable de la cabecera municipal

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2024	.00	.00	.00%	.00%
2023	377,596.00	144,422.88	38.25%	.00%
2022	13,444,093.00	12,283,971.51	91.37%	99.94%
2021	6,527,000.00	6,526,928.55	100.00%	30.00%
2020	4,243,209.00	3,768,867.73	88.82%	51.18%
2019	8,168,699.00	3,074,377.88	37.64%	20.28%
2018	10,050,696.00	.00	.00%	.08%
2017	.00	.00	.00%	.00%
		25,798,568.55		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2018

Fecha de finalización 31/12/2018

Descripción de la fase a financiar:


Mejoramiento del sistema de agua potable para la Cabecera Municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: **.00%** al: 28/03/24

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2018	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 28-MAR-24
TOTAL :	15,028,051	10,050,696		
Recursos internos :				
Gobierno central :				
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :	15,028,051	10,050,696		
BID-2242/BL-GU	15,028,051			
GRT-WS-11905-GU				

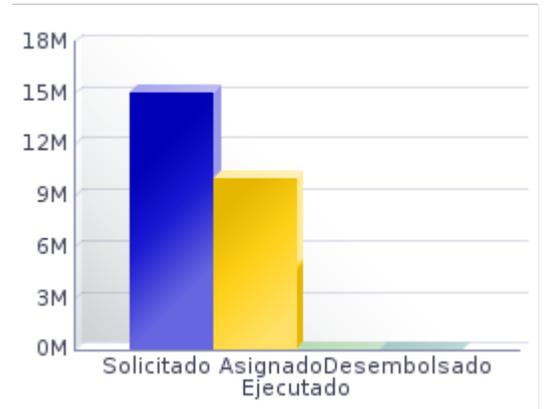

Seguimiento Físico

Avance físico: **.08%** al: 31/12/18

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Captación	m ²	1	
Conexiones prediales	Vivienda	603	
Línea de conducción	Metro	19,874	
Línea de distribución	Metro	9,235	
Tanque de distribución	m ³	92	
Trabajos preliminares	m ²	460	3
Tratamiento primario	Aporte	1	
Obras y trabajos complementarios	m ²	4,140	5

Seguimiento Administrativo

al: 15/11/2018

Problema(s) :

El proyecto no presenta avance físico

Accion(es) :

Se emitió la orden de inicio el 15-11-18

Responsable: Contratista

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s) :

Accion(es) :

Información complementaria:
