

**0062658 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SANTO TOMAS, ALDEA EL CARPINTERO, CHIANTLA, HUEHUETE**

SNIP - SEGEPLAN

**Boleta de Ejecución - Proyecto de Gobierno Local**

**Proyecto:** 62658  
**Nombre:** MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SANTO TOMAS, ALDEA EL CARPINTERO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO  
**Institución:** GOBIERNOS LOCALES  
**Unidad ejecutora:** MUNICIPALIDAD DE CHIANTLA  
**Modalidad de planificación :** Ejercicio de identificación de proyectos  
**Modalidad específica:** Ejercicio de identificación de proyectos  
**Función:** EDUCACION  
**Sub-función:** EDUCACION  
**Ubicación:**

Departamento	Municipio
HUEHUETENANGO	CHIANTLA

**Número de Operación de Guatecompras (NOG's):** - 772879

**Responsable del proyecto:**

Nombre: Ricardo René Herrera Alvarado  
Cargo: Alcalde Municipal  
Teléfono: 77644934  
Email: ricardo16980@gmail.com

**Descripción:**

El proyecto consiste en la Circulación del perímetro de la escuela, el cual será de block y tendrá una altura sobre el nivel del suelo de 2.60 metros, se realizaran dos tipos de muros, 73.43ml de muro tipo1, y 8.80 de muro tipo 2, la diferencia entre ambos es la profundidad y forma de la cimentación.

**Fase:** Ejecución

**Fecha de inicio de la fase:** 19/06/2009

**Fecha de finalización** 30/09/2009

**Descripción de la fase a financiar:**


El proyecto consiste en la Circulación del perímetro de la escuela, el cual será de block y tendrá una altura sobre el nivel del suelo de 2.60 metros, se realizaran dos tipos de muros, 73.43ml de muro tipo1, y 8.80 de muro tipo 2, la diferencia entre ambos es la profundidad y forma de la cimentación.

**Seguimiento Financiero**

**Avance Financiero:** 100.00% al: 03/11/2009

**Información de recursos financieros:**

	Programado 2009	Asignado Actualizado	Ejecutado al: 03-NOV-09
<b>TOTAL :</b>	141,910	139,500	139,500
<b>Recursos Municipales :</b>		139,500	139,500
Situado Constitucional :		139,500	139,500
IVA Paz :			
Ingresos Propios :			
Otros aportes :			
<b>Fuentes financiamiento :</b>			

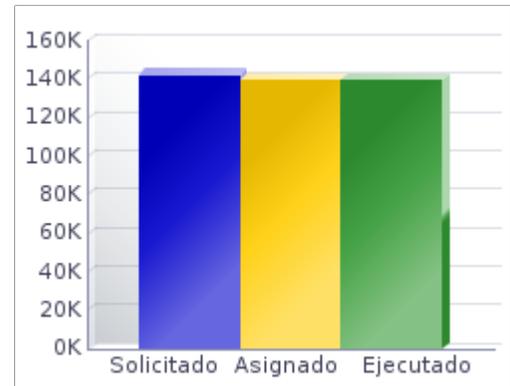

**Administrador de fondos :**

**Contratos:**

No.	Contratista	Fecha Inicio	Fecha Final
19-2009	2213313-5 CONSTRUCTORA KYRIOS	19/06/2009	19/10/2009

**Seguimiento Físico**

**Avance fisico:** 100.00% al: 16/11/2009

**Información de rubros:**

Rubro	Unidad de medida	Programado 2009	Reprogramado	Ejecutado
Cimentación	Aporte en espec	29	29	29
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamin)	m <sup>2</sup>	22	22	22
Trabajos preliminares	Aporte en espec	1	1	1

**Información complementaria:**
