

**0168886 - CONSTRUCCION EDIFICIO MERCADO DEPARTAMENTAL DE ARTESANÍAS, RÍO HONDO, ZACAPA**

SNIP - SEGEPLAN

**Boleta de Ejecución del Proyecto**

**Proyecto:** 168886  
**Nombre:** CONSTRUCCION EDIFICIO MERCADO DEPARTAMENTAL DE ARTESANÍAS, RÍO HONDO, ZACAPA  
**Institución:** CONSEJOS DE DESARROLLO  
**Unidad ejecutora:** MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO  
**Modalidad de planificación :** Proyectos Estrategicos Priorizados por Sociedad Civil  
**Modalidad especifica:** Proyectos Estrategicos Priorizados por Sociedad Civil  
**Función anterior:** **Finalidad-Función-Division**  
 OTRAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION 7-URBANIZACION Y SERVICIOS COMUNITARIOS  
**Sub-función anterior:** 2-DESARROLLO COMUNITARIO  
 OTRAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION 1-DESARROLLO COMUNITARIO  
**Ubicación:**

Departamento	Municipio
ZACAPA	RIO HONDO

**Número de Operación de Guatecompras (NOG's):** - 5208394 - 6366422

**Responsable del proyecto:**

Nombre: Oscar Ernesto Mata  
 Cargo: Alcalde Municipal  
 Teléfono: 79618585  
 Email: munirio1@yahoo.es

**Descripción:**

Se realizará la construcción del edificio para el mercado departamental de artesanías de Zacapa

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS**

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2022	2,057,757.00	2,057,757.00	100.00%	100.00%
2021	1,363,643.39	1,363,643.39	100.00%	100.00%
2020	263,743.60	263,743.60	100.00%	100.00%
2019	800,000.00	800,000.00	100.00%	100.00%
2018	1,701,380.20	1,701,380.20	100.00%	100.00%
2017	1,217,188.00	810,312.80	66.57%	65.23%
2016	1,000,000.00	800,000.00	80.00%	85.71%
		7,796,836.99		

**Fase: Ejecución**

Fecha de inicio de la fase: 01/10/2017

Fecha de finalización 31/12/2019

**Descripción de la fase a financiar:**


CONSISTE EN EL ADOQUINADO TIPO DECORATIVO, PAVIMENTO DE RAMPA DE ACCESO, ADOQUINADO PARA TIPO DE PLAZA, TANQUE METALICO ELVADO Y ACOMETIDA ELECTRICA.

**Seguimiento Financiero**

Avance Financiero: **66.57%** al: 20/02/18

**Información de recursos financieros:**

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2017	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 20-FEB-18
<b>TOTAL :</b>	1,017,188	1,217,188	810,313	810,313
<b>Recursos internos :</b>	1,017,188	1,217,188	810,313	810,313
Gobierno central :	1,017,188	1,217,188	810,313	810,313
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
<b>Otras fuentes :</b>				

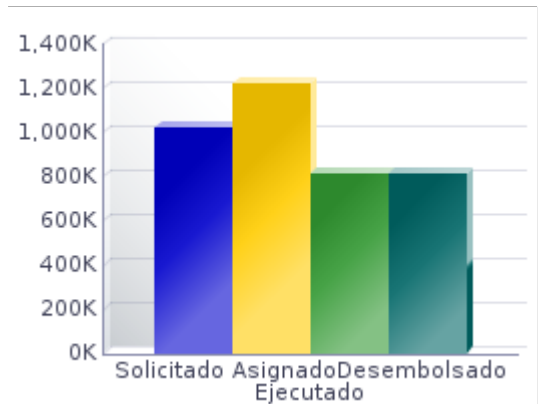

**Seguimiento Físico**

Avance fisico: **65.23%** al: 13/12/17

**Información de rubros:**

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Acabados	m <sup>2</sup>	350	350
Trabajos preliminares	m <sup>2</sup>	1,200	1,200
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir	m <sup>2</sup>	600	
Obra exterior y complementaria	m <sup>2</sup>	1,500	914

**Seguimiento Administrativo**

al:

Problema(s):

Accion(es):

Responsable:

**Seguimiento Cualitativo**

al:

Problema(s):

Accion(es):

**Información complementaria:**
