

138604 - CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES Y CENTRAL DE ABASTOS AGUA TIBIA, FASE I SAN PEDRO SOLOMA, HUEI

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución - Proyecto de Gobierno Local

Proyecto: 138604
Nombre: CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES Y CENTRAL DE ABASTOS AGUA TIBIA, FASE I SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
Institución: GOBIERNOS LOCALES
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos
Modalidad especifica: Ejercicio de identificación de proyectos
Función: DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sub-función: DESARROLLO URBANO Y RURAL
Ubicación:

Departamento	Municipio
HUEHUETENANGO	SAN PEDRO SOLOMA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's): - 2756420

Responsable del proyecto:

Nombre: Nicolás Gonzalo Martínez Diéguez
 Cargo: Alcalde Municipal
 Teléfono: 7780-6101
 Email:

Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de terminal de buses y central de abasto, fase I del municipio de San Pedro Soloma, departamento de Huehuetenango y se harán los siguientes renglones de trabajo: Preliminares: replanteo topográfico 19,000 m2, construcción de bodega 225 m2, instalaciones provisionales una unidad. Movimiento de tierras: cortes 24,375 metros 3, acarreo 11,875 m3. Tratamiento de suelos: Base granular 1,800 m3. Captaciones y drenaje francés: captaciones 9 unidades, drenaje francés. Muros de contención: muro No. 1. 438 m3, muro No. 2. 104 m3, muro No. 3. 586 m3, muro No. 4: 450 m3. Pavimentos: Pavimento central de abastos 2,355 m2, Pavimento calle de acceso 1,684 m2. Bordillos 425 ml. Modulo principal central de abastos: preliminares 1,615 ml, losa de cimentación 540 m2. Modulo locales anexos a central de abasto. 1,221 m2 preliminares. Instalaciones de drenaje pluvial y de aguas servidas una unidad, instalaciones de agua potable externa una unidad, instalaciones eléctricas alumbrado público una unidad.

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 02/01/2015

Fecha de finalización 29/04/2015

Descripción de la fase a financiar:


El proyecto consiste en la construcción de terminal de buses y central de abasto, fase I del municipio de San Pedro Soloma, departamento de Huehuetenango y se harán los siguientes renglones de trabajo: Preliminares: replanteo topográfico 19,000 m2, construcción de bodega 225 m2, instalaciones provisionales una unidad. Movimiento de tierras: cortes 24,375 metros 3, acarreo 11,875 m3. Tratamiento de suelos: Base granular 1,800 m3. Captaciones y drenaje francés: captaciones 9 unidades, drenaje francés. Muros de contención: muro No. 1. 438 m3, muro No. 2. 104 m3, muro No. 3. 586 m3, muro No. 4: 450 m3. Pavimentos: Pavimento central de abastos 2,355 m2, Pavimento calle de acceso 1,684 m2. Bordillos 425 ml. Modulo principal central de abastos: preliminares 1,615 ml, losa de cimentación 540 m2. Modulo locales anexos a central de abasto. 1,221 m2 preliminares. Instalaciones de drenaje pluvial y de aguas servidas una unidad, instalaciones de agua potable externa una unidad, instalaciones eléctricas alumbrado público una unidad.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 02/12/2021

Información de recursos financieros:

	Programado 2015	Asignado Actualizado	Ejecutado al: 02-DEC-21
TOTAL :	4,723,121	4,723,121	
Recursos Municipales :		4,723,121	
Situado Constitucional :			
IVA Paz :			
Ingresos Propios :		2,950,099	
Otros aportes :		1,773,022	
Fuentes financiamiento :			

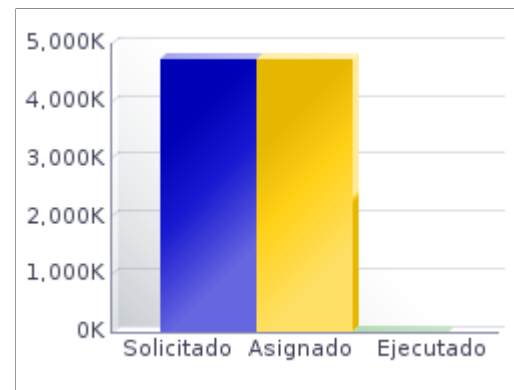

Administrador de fondos :

Contratos:

No.	Contratista	Fecha Inicio	Fecha Final

Seguimiento Físico

Avance físico: .00% al: 02/12/2021

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Programado 2015	Reprogramado	Ejecutado
Acabados	Unidad Monetari	2	2	
Cimentación	m ³	39,710		
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamin)	m ³	1,578	578	
Instalaciones (interior edificio)	Unidad Monetari	3	3	
Obra exterior y complementaria	m ²	4,474	1,500	
Trabajos preliminares	m ²	19,225		

Información complementaria:
