

**0149618 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VALLE LA ESMERALDA, DOLORES PETÉN**

SNIP - SEGEPLAN

**Boleta de Ejecución del Proyecto**

**Proyecto:** 149618  
**Nombre:** CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VALLE LA ESMERALDA, DOLORES PETÉN  
**Institución:** CONSEJOS DE DESARROLLO  
**Unidad ejecutora:** MUNICIPALIDAD DE DOLORES  
**Modalidad de planificación :** Ejercicio de identificación de proyectos  
**Modalidad específica:** Ejercicio de identificación de proyectos  
**Función anterior:** **Finalidad-Función-Division**  
 AGUA Y SANEAMIENTO 7-URBANIZACION Y SERVICIOS COMUNITARIOS  
**Sub-función anterior:** 3-ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 AGUA Y SANEAMIENTO 1-ABASTECIMIENTO DE AGUA  
**Ubicación:**

Departamento	Municipio
PETEN	DOLORES

**Número de Operación de Guatecompras (NOG's):** - 3393828

**Responsable del proyecto:**

Nombre: MARVIN ROLANDO CRUZ GUZMAN  
 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL  
 Teléfono:  
 Email:

**Descripción:**

El proyecto consiste en la construcción de la primera fase del sistema de agua potable, del caserío Valle la Esmeralda, que incluye: Construcción de 5,911 metros de línea de conducción, utilizando tubería PVC 4" de diámetro de 160 y 250 PSI, y construcción de su respectiva captación.

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS**

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2014	2,493,267.22	877,630.05	35.20%	60.31%
		877,630.05		

0149618 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VALLE LA ESMERALDA, DOLORES PETÉN

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/05/2014

Fecha de finalización 30/08/2014

Descripción de la fase a financiar:


El proyecto consiste en la construcción de la primera fase del sistema de agua potable, del caserío Valle la Esmeralda, que incluye: Construcción de 5,911 metros de línea de conducción, utilizando tubería PVC 4" de diámetro de 160 y 250 PSI, y construcción de su respectiva captación.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: **35.20%** al: 01/07/15

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2014	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 01-JUL-15
<b>TOTAL :</b>	2,496,060	2,493,267		877,630
<b>Recursos internos :</b>				
Gobierno central :				
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
<b>Otras fuentes :</b>	2,496,060	2,493,267		877,630
FONPETROL	2,496,060	2,493,267		877,630

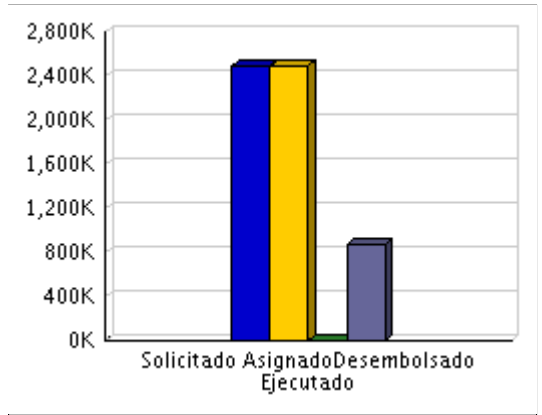

Seguimiento Físico

Avance físico: **60.31%** al: 01/07/15

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Captación	Monumento	1	1
Línea de conducción	Metro	5,911	3,333

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:
