

**0136962 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO CANTON PANIMACHE PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE**

SNIP - SEGEPLAN

**Resumen del Proyecto**

**Proyecto:** 136962  
**Nombre:** AMPLIACION INSTITUTO BASICO CANTON PANIMACHE PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE  
**Institución:** CONSEJOS DE DESARROLLO  
**Unidad ejecutora:** MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO  
**Modalidad de planificación :** Ejercicio de identificación de proyectos  
**Modalidad específica:** Ejercicio de identificación de proyectos  
**Función anterior:** Finalidad-Función-Division  
 EDUCACION 10-EDUCACION  
**Sub-función anterior:** 2-EDUCACION MEDIA  
 EDUCACION 1-EDUCACION BASICA  
**Ubicación:**

Departamento	Municipio
QUICHE	CHICHICASTENANGO

**Número de Operación de Guatecompras (NOG's):**

**Responsable del proyecto:**

Nombre: ROSENDO SALVADOR  
 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL  
 Teléfono: 4823-9678  
 Email: MUNICHICHI@YAHOO.ES

**Descripción:**

DE ACUERDO AL PERFIL

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS**

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2018	.00	.00	.00%	.00%
2016	400,000.00	240,000.00	60.00%	66.09%
2014	.00	.00	.00%	.00%
		240,000.00		

**Fase: Ejecución**

Fecha de inicio de la fase: 01/07/2016

Fecha de finalización 01/10/2016

**Descripción de la fase a financiar:**


Construcción de 3 aulas para ampliar la cobertura educativa con todas las especificaciones técnicas según planos y que incluyen los siguientes: trabajos preliminares con 178.50 M2, replanteo topográfico, 18 unidades de zapatas de concreto, cimiento corrido de concreto con 67 M, levantado de muro de block con 26.80 M2, solera hidrófuga de concreto con 59.50 M, levantado de muro de block sobre solera hidrófuga con 110 M2, construcción de viga principal de concreto con 56.60; viga secundaria de 50 M, viga de amarre de concreto con 19.30 M, solera intermedia de concreto 56.50 M, columna tipo A de concreto armado con 61.20 M, columna tipo E de concreto armado de 27.20; columna tipo C de concreto armado con 10.20 M, trabajos de bases para piso+ piso cerámico con 161.50; Losa de concreto tipo vigueta bovedilla de 0.15 cm+fundición de 0.05 cm de 500 kg. con 161.50; Instalación de drenaje pluvial con tubería P.V.C. con 18 M, Acabados finales, repello+cernido y blanqueado en paredes con 230 M2, Instalación eléctrica de iluminación, instalación eléctrica de fuerza, 3 puertas de metal, ventanería con marco de hierro según diseño de planos 43.82 M2, mobiliario y equipo y rótulo de identificación del proyecto.

**Seguimiento Financiero**

Avance Financiero: **60.00%** al: 30/12/16

**Información de recursos financieros:**

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2016	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 30-DEC-16
<b>TOTAL :</b>	514,000	400,000	240,000	240,000
<b>Recursos internos :</b>	514,000	400,000	240,000	240,000
Gobierno central :	400,000	400,000	240,000	240,000
Comunidad :				
Aporte municipal :	114,000			
Otros aportes :				
<b>Otras fuentes :</b>				

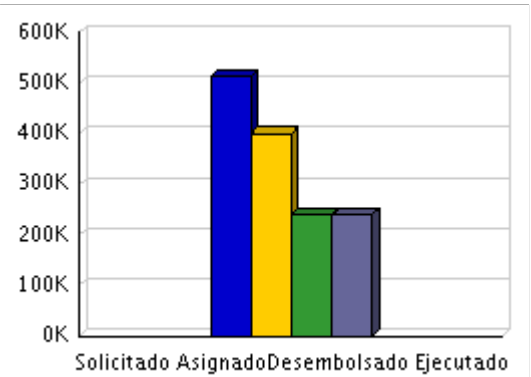

**Seguimiento Físico**

Avance físico: **66.09%** al: 21/10/16

**Información de rubros:**

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Acabados	m <sup>2</sup>	230	230
Cimentación	m <sup>2</sup>	67	67
Equipamiento	Artículo de madera	91	91
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir)	m <sup>2</sup>	110	59
Instalaciones (interior edificio)	Metro	6	
Obra exterior y complementaria	Artículo de metal	1	
Puertas y ventanas	Artículo de metal	3	
Trabajos preliminares	m <sup>2</sup>	178	178
Instalación Eléctrica	Metro	9	9

**Seguimiento Administrativo**

al:

Problema(s) :

Accion(es) :

**0136962 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO CANTON PANIMACHE PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE**

SNIP - SEGEPLAN

**Resumen del Proyecto**

**Responsable:**

**Seguimiento Cualitativo**

**al:**

**Problema(s):**

**Accion(es):**

**Información complementaria:**
