

**0172174 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SACPULUP, CHICHICASTENANGO, QUICHE**

SNIP - SEGEPLAN

**Resumen del Proyecto**

**Proyecto:** 172174  
**Nombre:** MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SACPULUP, CHICHICASTENANGO, QUICHE  
**Institución:** CONSEJOS DE DESARROLLO  
**Unidad ejecutora:** MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO  
**Modalidad de planificación :** Ejercicio de identificación de proyectos  
**Modalidad específica:** Ejercicio de identificación de proyectos  
**Función anterior:** **Finalidad-Función-Division**  
 EDUCACION 10-EDUCACION  
**Sub-función anterior:** 1-EDUCACION PREPRIMARIA Y PRIMARIA  
 EDUCACION 2-EDUCACION PRIMARIA  
**Ubicación:**

Departamento	Municipio
QUICHE	CHICHICASTENANGO

**Número de Operación de Guatecompras (NOG's):**

**Responsable del proyecto:**

Nombre: Rosendo Salvador Cuterez  
 Cargo: Alcalde Municipal  
 Teléfono: 48239678  
 Email: Munichichi@yahoo.es

**Descripción:**

MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA DEL CANTON SACPULUP A BENEFICIO DE LA POBLACION ESCOLAR.

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS**

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2017	.00	.00	.00%	.00%
2016	400,000.00	240,000.00	60.00%	65.00%
		240,000.00		

**Fase: Ejecución**

Fecha de inicio de la fase: 01/07/2016

Fecha de finalización 01/09/2016

**Descripción de la fase a financiar:**

El proyecto consistirá en la construcción de Techado de Lamina con Estructura Metálica, dicha construcción comprende las siguientes actividades:


- Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo y trazo (560 M2)
- Zapatas de concreto tipo ZP-1 210 kg/cm2 (12 unidades)
- Columnas de concreto tipo P-1 210 kg/cm2
- Viga de cimentación de concreto, 210 kg/cm2
- Instalación sistema de drenajes pluviales P.V.C+ cajas de unión
- Instalaciones eléctricas: luz y fuerza
- Cubierta metálica con lámina troquelada esmaltada cal.
- rótulo de identificación del proyecto

**Seguimiento Financiero**

Avance Financiero: **60.00%** al: 30/12/16

**Información de recursos financieros:**

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2016	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 30-DEC-16
<b>TOTAL :</b>	450,000	400,000	240,000	240,000
<b>Recursos internos :</b>	450,000	400,000	240,000	240,000
Gobierno central :	400,000	400,000	240,000	240,000
Comunidad :				
Aporte municipal :	50,000			
Otros aportes :				
<b>Otras fuentes :</b>				

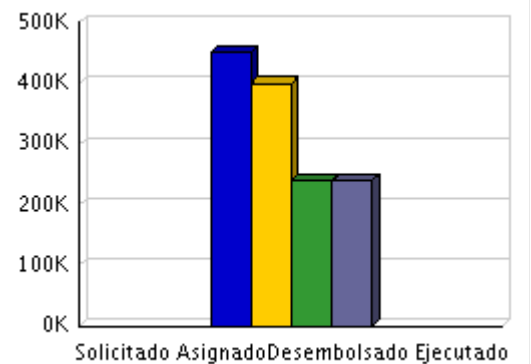

**Seguimiento Físico**

Avance fisico: **65.00%** al: 24/10/16

**Información de rubros:**

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Cimentación	Metro	12	12
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir	m <sup>2</sup>	620	465
Instalaciones (interior edificio)	Metro	15	
Obra exterior y complementaria	Artículo de metal	1	
Trabajos preliminares	m <sup>2</sup>	560	560
Instalación Electrica	Metro	15	

**Seguimiento Administrativo**

al:

Problema(s) :

Accion(es) :

Responsable:

**0172174 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SACPULUP, CHICHICASTENANGO, QUICHE**

SNIP - SEGEPLAN

**Resumen del Proyecto**

**Seguimiento Cualitativo** al:

**Problema(s):** **Accion(es):**

**Información complementaria:**
