

0172174 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SACPULUP, CHICHICASTENANGO, QUICHE

SNIP - SEGEPLAN

Resumen del Proyecto

Proyecto: 172174
Nombre: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SACPULUP, CHICHICASTENANGO, QUICHE
Institución: CONSEJOS DE DESARROLLO
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos
Modalidad específica: Ejercicio de identificación de proyectos
Función anterior: **Finalidad-Función-Division**
 EDUCACION 10-EDUCACION
Sub-función anterior: 1-EDUCACION PREPRIMARIA Y PRIMARIA
 EDUCACION 2-EDUCACION PRIMARIA
Ubicación:

Departamento	Municipio
QUICHE	CHICHICASTENANGO

Número de Operación de Guatecompr

Responsable del proyecto:

Nombre: Rosendo Salvador Cuterez
 Cargo: Alcalde Municipal
 Teléfono: 48239678
 Email: Munichichi@yahoo.es

Descripción:

MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA DEL CANTON SACPULUP A BENEFICIO DE LA POBLACION ESCOLAR.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2017	.00	.00	.00%	.00%
2016	400,000.00	240,000.00	60.00%	65.00%
		240,000.00		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/07/2016

Fecha de finalización 01/09/2016

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consistirá en la construcción de Techado de Lamina con Estructura Metálica, dicha construcción comprende las siguientes actividades:


- Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo y trazo (560 M2)
- Zapatas de concreto tipo ZP-1 210 kg/cm2 (12 unidades)
- Columnas de concreto tipo P-1 210 kg/cm2
- Viga de cimentación de concreto, 210 kg/cm2
- Instalación sistema de drenajes pluviales P.V.C+ cajas de unión
- Instalaciones eléctricas: luz y fuerza
- Cubierta metálica con lámina troquelada esmaltada cal.
- rótulo de identificación del proyecto

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: **60.00%** al: 30/12/16

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2016	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 30-DEC-16
TOTAL :	450,000	400,000	240,000	240,000
Recursos internos :	450,000	400,000	240,000	240,000
Gobierno central :	400,000	400,000	240,000	240,000
Comunidad :				
Aporte municipal :	50,000			
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

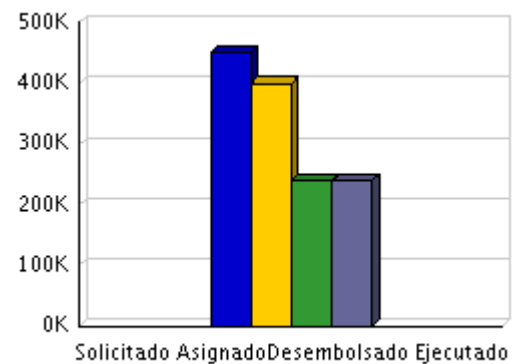

Seguimiento Físico

Avance fisico: **65.00%** al: 24/10/16

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Cimentación	Metro	12	12
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir	m ²	620	465
Instalaciones (interior edificio)	Metro	15	
Obra exterior y complementaria	Artículo de metal	1	
Trabajos preliminares	m ²	560	560
Instalación Electrica	Metro	15	

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s) :

Accion(es) :

Responsable:

0172174 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SACPULUP, CHICHICASTENANGO, QUICHE

SNIP - SEGEPLAN

Resumen del Proyecto

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s): **Accion(es):**

Información complementaria:
