

0168886 - CONSTRUCCION EDIFICIO MERCADO DEPARTAMENTAL DE ARTESANÍAS, RÍO HONDO, ZACAPA

SNIP - SEGEPLAN

Resumen del Proyecto

Proyecto: 168886
Nombre: CONSTRUCCION EDIFICIO MERCADO DEPARTAMENTAL DE ARTESANÍAS, RÍO HONDO, ZACAPA
Institución: CONSEJOS DE DESARROLLO
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
Modalidad de planificación : Plan de desarrollo o agenda departamental
Modalidad especifica: Plan de desarrollo o agenda departamental
Función anterior: **Finalidad-Función-Division**
 OTRAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION 7-URBANIZACION Y SERVICIOS COMUNITARIOS
Sub-función anterior: 2-DESARROLLO COMUNITARIO
 OTRAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION 1-DESARROLLO COMUNITARIO
Ubicación:

Departamento	Municipio
ZACAPA	RIO HONDO

Número de Operación de Guatecompr

Responsable del proyecto:

Nombre: Oscar Ernesto Mata
 Cargo: Alcalde Municipal
 Teléfono: 79618585
 Email: munirio1@yahoo.es

Descripción:

Se realizará la construcción del edificio para el mercado departamental de artesanías de Zacapa

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2018	.00	.00	.00%	.00%
2017	1,217,188.00	203,437.60	16.71%	100.00%
2016	1,000,000.00	800,000.00	80.00%	80.00%
		1,003,437.60		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/04/2017

Fecha de finalización 30/09/2017

Descripción de la fase a financiar:


Construir 160.00 metros cuadrados

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: **16.71%** al: 13/07/17

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2017	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 13-JUL-17
TOTAL :	1,017,188	1,217,188	203,438	203,438
Recursos internos :	1,017,188	1,217,188	203,438	203,438
Gobierno central :	1,017,188	1,217,188	203,438	203,438
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

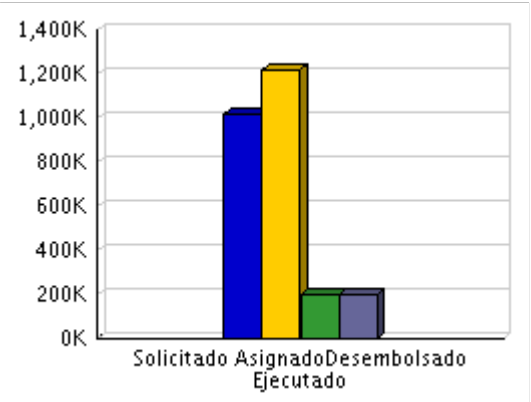

Seguimiento Físico

Avance fisico: **100.00%** al: 14/06/17

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Acabados	Aporte	1	1

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s) :

Accion(es) :

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s) :

Accion(es) :

Información complementaria:
