

0081026 - RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA

SNIP - SEGEPLAN

Resumen del Proyecto

Proyecto: 81026
Nombre: RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA
Institución: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad ejecutora: DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
Modalidad de planificación : Programas de reconstrucción
Modalidad especifica: Tormenta Tropical Agatha
Función anterior: **Finalidad-Función-Division**
TRANSPORTE 5- ASUNTOS ECONOMICOS
Sub-función anterior: 5-TRANSPORTE
TRANSPORTE 1-TRANSPORTE POR CARRETERA
Ubicación:

Departamento	Municipio
GUATEMALA	CHINAUTLA

Número de Operación de Guatecompr_ 1465449 - 1486683

Responsable del proyecto:

Nombre: Lic. Delfino Mendoza
Cargo: Coordinador de Planificación y Estudios
Teléfono:
Email: dfmendoz@caminos.gob.gt

Descripción:

Reconstrucción Puente Aldea Santa Cruz, sobre el Río Chinautla

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2016	.00	.00	.00%	.00%
2015	3,350,000.00	1,615,440.71	48.22%	81.84%
2014	2,709,136.00	2,573,928.86	95.01%	83.09%
2013	1,201,853.00	1,201,853.00	100.00%	56.19%
2012	6,300,000.00	3,098,499.07	49.18%	.00%
2011	5,210,000.00	2,700,598.60	51.83%	31.69%
		11,190,320.24		

0081026 - RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA

SNIP - SEGEPLAN

Resumen del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 05/01/2015

Fecha de finalización 28/02/2015

Descripción de la fase a financiar:


Ejecución

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: **48.22%** al: 30/12/15

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2015	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 30-DEC-15
TOTAL :	5,250,000	3,350,000		1,574,690
Recursos internos :	5,250,000			
Gobierno central :	5,250,000			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :		3,350,000		1,574,690

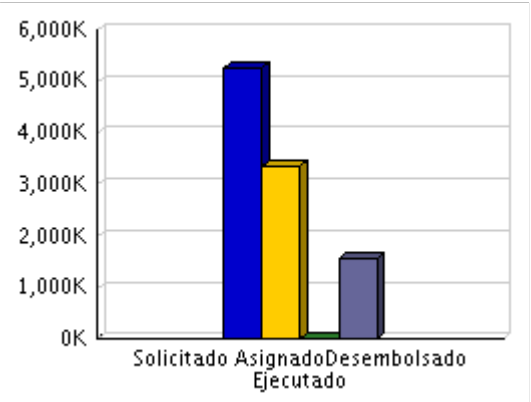

Seguimiento Físico

Avance físico: **81.84%** al: 25/03/15

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Renglones varios	Kilogramo	5,000	3,991
Supervision	Documento	2	2

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:
