Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 170326

Nombre: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUCOJOM, CHICHICASTENANGO, QUICHE

Institución: CONSEJOS DE DESARROLLO

Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO

Modalidad de planificación : Plan de desarrollo o agenda municipal

Modalidad especifica: Plan de desarrollo o agenda municipal

Finalidad-Función-Division

Función anterior: TRANSPORTE — 5-ASUNTOS ECONOMICOS

Sub-función anterior: TRANSPORTE — 5-TRANSPORTE

Ubicación: 1-TRANSPORTE POR CARRETERA

Departamento	Municipio
QUICHE	CHICHICASTENANGO

Número de Operación de Guatecompras (NOG's): - 5276667

Responsable del proyecto:

Nombre: Rosendo Salvador Cuterez

Cargo: Alcalde Municipal

Teléfono: 48239678

Email: munichichi@yahoo.es

Descripción:

EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL A TRAVES DEL ADOQUINAMIENTO DE UN TRAMO QUE CONDUCE AL CANTON CHUCOJOM CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
TRABAJOS PRELIMINARES CON 500 M2.
ROTULO DE IDENTIFICACION
CORTE, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE CON 162 M3
COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE CON 500 M2
COLOCACION DE ADOQUIN CON 470 M2
CONSTRUCCION DE LLAVES DE CONFINAMIENTO CON 50 ML
CONSTRUCCION DE BORDILLOS CON 250 ML

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2017	40,000.00	40,000.00	100.00%	.00%
2016	200,000.00	160,000.00	80.00%	80.11%
		200,000.00		

Fase: *Ejecución*

Fecha de inicio de la fase: 01/06/2016 **Fecha de finalización** 01/08/2016

Descripción de la fase a financiar:

EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR UN TRAMO DEL CAMINO RURAL DEL CANTON CHUCOJOM CON ADOQUINADO CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES CON 389 M2, CORTE, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE CON 389 M3, COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE CON 389 M2, COLOCACION DE ADOQUIN CON 365 M2, CONSTRUCCION LLAVES DE CONFINAMIENTO CON 47 ML, CONSTRUCCION DE BORDILLOS CON 190 ML, Y ROTULO DE IDENTIFICACIÓN.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: **80.00%** al: **30/12/16**

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2016	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 30-DEC-16
TOTAL :	200,000	200,000	160,000	160,000
Recursos internos :	200,000	200,000	160,000	160,000
Gobierno central :	200,000	200,000	160,000	160,000
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

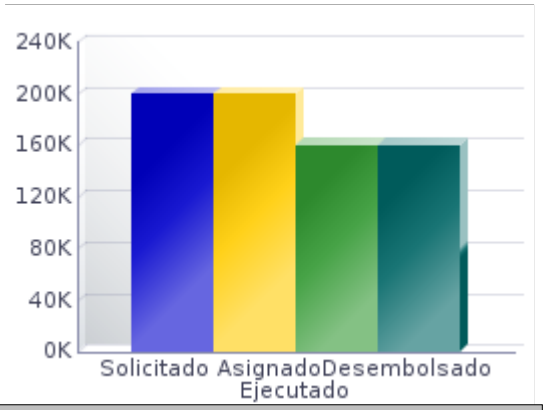

Seguimiento Físico

Avance fisico: **80.11%** al: **12/12/16**

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Base	m²	389	389
Construcciones complementarias	Metro	35	35
Estructuras de drenaje	Metro	7	7
Movimiento de tierras	m³	97	97
Sub bases	m²	389	389
Superficie de rodadura	m²	389	244
Trabajos preliminares	m²	389	

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:
